

DĘBICA, 15.03.2024

PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH/PODEJMOWANIA INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU

1. OPIS OBECNEGO STANU ZACHOWANIA OBIEKTU:

OGÓLNY STAN PRZEDMIOTOWEGO KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO JEST DOBRY. W WYNIKU DZIAŁANIA CZASU I WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, USZKODZENIU (UŁAMANIU) ULEGŁ KRZYŻ NA WIEŻY DACHU, KTÓRY ZOSTAŁ ZDEMONTOWANY WRAZ Z KULĄ PODSTAWY.

2. PRZEWDZIANE DO REALIZACJI ROZWIĄZANIA – OPIS SZCZEGÓŁOWY, METODY, MATERIAŁY, TECHNIKA:

W ZAKRESIE PROWADZONYCH PRAC PRZEWIDUJE SIĘ DEMONTAŻ GÓRNEJ WIEŻYCZKI KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO I KONSTRUKCJI ZABEZPIECZAJĄCEJ POKRYCIE BLACHY. NASTĘPNIE WYKONANY ZOSTANIE DEMONTAŻ DZWONU ORAZ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ, DEMONTAŻ KOLUMNY SŁUPÓW I PODSTAWY NOŚNEJ NAD KALENICĄ. CAŁOŚCI DACHU ZOSTANIE ZABEZPIECZONA NA CZAS WYKONYWANIA NOWEJ WIEŻY. W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI WYKONANA ZOSTANIE NOWA KONSTRUKCJA PODSTAWY WIEŻY WRAZ Z ODBUDOWĄ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ POD DACHEM. WYKONANA ZOSTANIE KONSTRUKCJA KOLUMNADY WRAZ Z PODSTAWĄ I KONSTRUKCJĄ WIEŃCZĄCĄ POD WIEŻĘ GÓRNĄ. W OSTATNIM ETAPIE WYKONANA ZOSTANIE WIEŻA GÓRNA, WRAZ Z POKRYCIEM BLACHĄ MIEDZIANĄ.

ZAMONTOWANY ZOSTANIE ZDEMONTOWANY POPRZEDNIO STALOWY KRZYŻ WRAZ Z KULĄ. KRZYŻ POSIADA IGLICĘ ODGROMOWĄ KTÓRA ZOSTANIE POŁĄCZONA Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ.

WSZYSTKIE WYMIARY ZDEMONTOWANYCH ELEMENTÓW ZOSTANĄ ODTWORZONE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI WYMIARAMI WIEŻY.

KONSTRUKCJA WIEŻY WYKONANA ZOSTANIE Z DREWNA KONSTRUKCYJNEGO, ŁĄCZONEGO ŁĄCZAMI CIESIELSKIMI ORAZ OBEJMAMI, WKRĘTAMI I ŚRUBAMI STALOWYMI, ZGODNIE Z WYKONANIEM ORYGINALNYM.

PODCZAS DEMONTAŻU SYGNATURKI WYKONANA ZOSTANIE SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA I DOKUMENTACJA TECHNICZNA ELEMENTU BUDYNKU JAK W ZAKRESIE PRAC.

3. ZAŁĄCZNIK FOTOGRAFICZNY, RYSUNKOWY, WIZUALIZACJA:

FOT. 1 - UŁAMANY KRZYŻ

FOT. 2 - KULA PODSTAWY KRZYŻA


WIZUALIZACJA (ELEMENT INWENTARYZACJI CYFROWA KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO SPORZĄDZONA METODĄ SKANU 3D)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyślu
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 353-94-62
NIP: 795-20-71-175

Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z up. *J. Podubny*
Bartosz Podubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

mgr inż. Jarosław ŚLIWA
Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania
i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. K-166/01
39-200 Dębica, ul. Robotnicza 10/28, tel. 670 48 01

FOT. 1

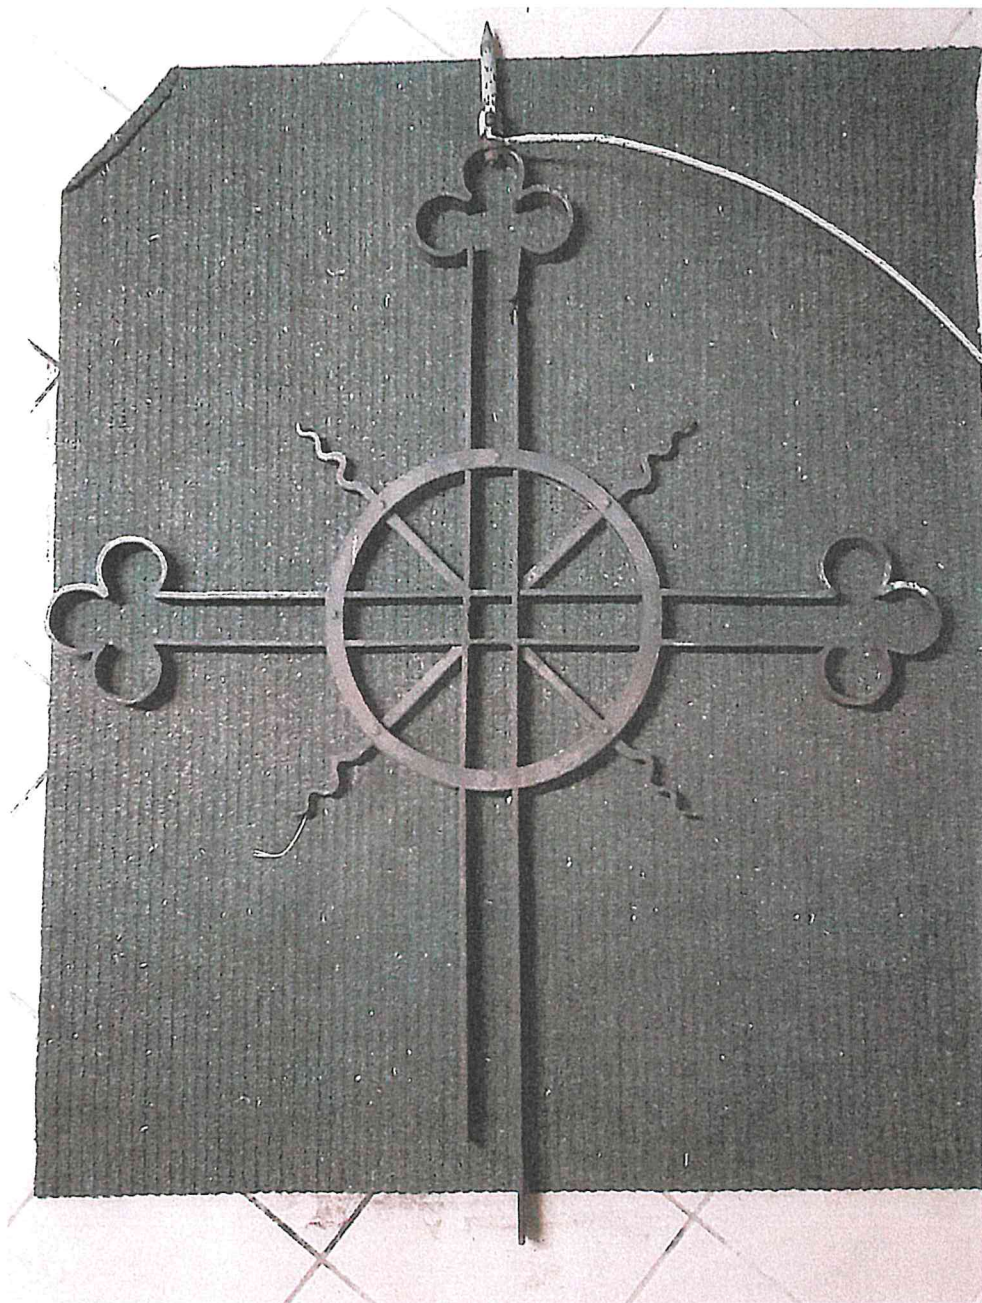

mgr inż. Jarosław ŚLIWA
Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania
i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. K-166/01
39-200 Debica, ul. Robotnicza 10/28, tel. 670 48 01

FOT. 2




mgr inż. Jarosław ŚLIWA

Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania
i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid: K-166/01
39-200 Dębica, ul. Robotnicza 10/28, tel. 670 48 01

WIZUALIZACJA

(ELEMENTY PODLEGAJĄCE REMONTOWI POKAZANE NA CZERWONO)

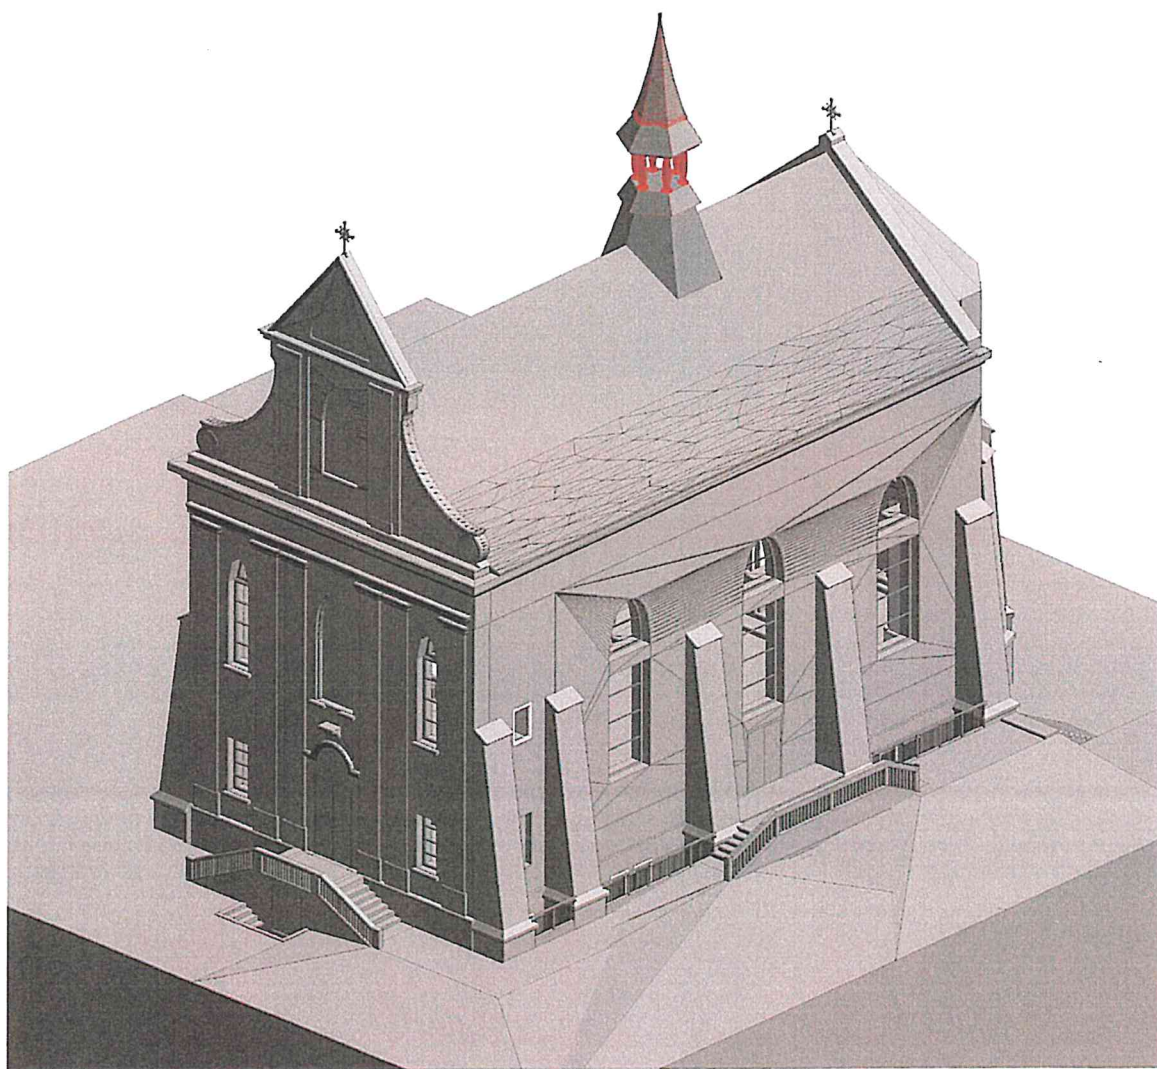

mgr inż. Jarosław ŚLIWA

Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania
i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. K-166/01
39-200 Dębica, ul. Robotnicza 10/28; tel. 670 48 01
